

2025년 행정사무감사
2025 주요업무 추진상황

도로교통국

1. 100만 도시 파주 교통정책 플랫폼 구축

● 수도권광역급행철도(GTX) 개통

· 구간: 파주(운정)~삼성, L=46.0km

- 추진실적: GTX-A 개통 '24.12.28.개통 / 운정중앙역~서울역 구간
- 추진계획: GTX-A 전구간 개통 '28년 개통 예정

● 서해선(대곡소사) 파주 연장 추진

· 구간: 운정역~일산역, L=5.3km

- 추진실적: 추진계획 확정 '24. 1./위·수탁협약 '24. 8./설계착수 '25. 3.
- 추진계획: 공사 착공 '25. 12. / 준공 및 개통 '26. 12.

● 모빌리티 개선계획 용역 추진

· 내용: 모빌리티 추진목표 설정 및 신규 도입·개선 방향 제시

- 추진실적: “파주시 모빌리티 개선계획 수립 용역” 착수 '25. 3.
- 추진계획: 용역 준공 '26. 2.

● 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진

· 대상노선: 3호선, 통일로선(조리금촌선), KTX 파주 연장

- 추진실적: 국가철도망 구축계획 반영 건의 철도망 구축 국회토론회 '24.11.29.
- 추진계획: 국가철도망 구축계획 반영 '25.下

● 경의중앙선 지하화 및 상부개발 추진

· 내용: 경의중앙선 철도구간 지하화를 통한 상부·인접구역 개발

- 추진실적: 지하화 전략 수립 연구용역 착수 '25. 3.
- 추진계획: 철도지하화 통합개발 종합계획 반영 '25.下

2. 빠르고 편리한 교통환경 조성

● 운정신도시 교통혼잡 개선

- 신도시 전역 교통신호 최적화 및 불합리한 기하구조 개선
- 시뮬레이션을 통한 주요도로, 혼잡교차로* 중심 교통대책 마련
* 와동, 벨엘교회, 다울교차로 및 운정역 P1, P2 일원
- GTX, 심학산로 집중 모니터링 및 개선사항 추가 반영
- 우선순위를 고려한 단기, 중장기 단계별 추진계획 수립
- 시도1호선 등 우회도로 조기개통을 위한 기관간 협업체계 구축
- 교통전문가, 전문기관 자문 등을 통한 검증절차 이행



● 추진실적 및 향후계획

- '25. 2. 남북로 변속차로 설치, 물향기마을 일원 개선 요청(→LH) ※ LH 반영 예정
- '25. 3.12. P1, P2블록 주상복합 개선안 반영 요청(→주택과) ※ 사업시행자 반영 예정
- '25. 7. ~ 12. 개선안 반영

3. 교통약자 이동편의 증진 및 보행 안전 확대

● 교통약자 특별교통수단 확대 운영(2025. 6월)

구분	기존	확대
특별교통수단(특장차)	36대	41대(5대 증차)
대체수단(바우처 택시)	50대	65대(15대 증차)

※ 이용실적: 2,065명 50,458건(2025. 4월 기준)



특별교통수단



바우처 택시

● 어린이·노인 보호구역 개선

구분	어린이 보호구역 개선사업	노인 보호구역 개선사업
대상	갈현초교 등 24개교	금곡2리 경로당 등 8개소
사업기간	2025. 5. ~ 12.	“
사업내용	보호구역 기종점 정비 및 무인교통단속장비 등 설치	보호구역 지정 및 정비를 위한 교통안전시설물 설치
예산액	금1,196,000천원(도50%, 시50%)	금195,000천원(도50%,시50%)

1. 파주시 대중교통 안정적 운영

● 시내버스 공공관리제 단계적 안착

- 2024년 추진실적 : 13개 노선 94대
 - 道 주관: 10개 노선(85대)
 - 市 주관: 3개 노선(9대)
- 노선신설(374번)
 - 774번 폐선에 따른 공공관리제 노선 신설('25. 6.)
 - 道 주관 9대

시내버스 374번 운행안내

신설운행 374번
 운행개시 2025. 6. 1.(일) 04:40
 운행경로 파주5리~신산리~용미리~삼송동~구파발역
 ※서울버스 774번은 5. 31까지 운행후 운행중단
 문의 (주)뉴신일 031-952-0714, 031-958-0711

서울버스 774번 폐선으로 경기도버스374번이 운행하오니 이용에 참고해주시기 바랍니다.

● GTX 중심 버스노선 안정화

- 대 상 : 12개 노선 83대
- 추진실적 및 계획
 - 2024. 12. 28. 마을버스 10개 노선 74대 운정중앙역 경유 운행
 - 2025. 2. 8. 시내버스 2개 노선 운송개시 (101번, 202번)
 - 2025. 6. "GTX 운정중앙역" 이용수요 및 민원사항 분석
 - 2025. 7. GTX 중심 버스노선 개선 방안 수립



2. 시민 누구나 만족하는 맞춤형 교통 운영

● 파주형 간선급행 시내버스 운영

- 구도심과 신도심을 연결하는 빠르고 편리한 교통 편의 도모
 - 운행개시: 2025. 2. 8.(토)
 - 운행노선: PBRT 1노선(5대)[적성~파평~문산~월롱~금촌~GTX 운정중앙역]
PBRT 2노선(4대)[법원~연풍~광탄~GTX 운정중앙역]

● 파주형 학생전용 통학순환버스 운영

- 2025년 파프리카 확대 운행
 - (기존) : 2개 노선(운정 2 / 10대) → (확대): 7개 노선(운정 2, 금촌 3, 문산 2 / 17대)
- 운행 개선사항
 - 기점 통합·변경, 노선연장 등
- 향후계획
 - 운행 상황 모니터링에 따른 경로, 시간 등 검토·개선

2. 시민 누구나 만족하는 맞춤형 교통 운영

● 마을버스 공공화 추진

《1단계》 파주형 청소년 기본교통 확대

- 지원대상 : 파주시 거주 만 13세 ~ 18세 청소년
- 지원내용 : 마을버스(파프리카 포함) 교통비 지원
→ 분기별 6만원
- 지원방법 : 신청자에 한해 전용카드 발급 후 사용
→ 실적 검증 후 지역화폐 환급
- 향후계획
 - '25. 4. ~ 8. 각종 협의 및 심의(사회보장제도 등)
 - '25. 9. 3회 추경예산 편성 484,000천원
 - '25. 10. ~ '26. 3. 시스템 구축, 테스트, 홍보
 - '26. 4. 사업 시행(예정)

《2단계》 마을버스 공공화 용역 추진

- 용역명 : 마을버스 공공화 추진 타당성 조사
- 용역기간 : 2025. 6. ~ 12.
- 용역비 : 100,000천원
- 용역내용 : 마을버스 공공화 추진을 위한 구체적인 방안 마련과 효과 분석 등을 토대로 관련 정책 및 기본계획 수립
- 향후계획
 - '25. 5. 용역업체 선정 및 용역과제 협의
 - '25. 6. ~ 12. 연구용역 착수

3. 안정적인 교통서비스 제공

● 대중교통 불편지역 천원택시 운영

■ 2025년 천원택시 운행 현황

- 10개 읍면동 63개 마을 운행(212개 구간) / 2024년 기준 142,213회 이용
- 사업예산: 1,400백만원(국50%, 시50%)

■ 운행마을 외 대중교통 사각지역 발굴

- 천원택시 활성화 방안 연구 용역 준공('25. 4.)
- 운영계획 수립, 수요조사, 사각지역 반영 등을 통해 신규(확대)



● 택시요금 지역화폐 결제 추진

■ 지역화폐 인센티브로 택시요금 절감 효과

- 시민들의 경제적 부담 경감, 택시 이용 증가
- 택시업계 활력 도모 및 지역상권 상생

■ 개인택시 우선 추진, 일반택시 확대 방안

- 일반택시 간담회 개최(2회), 道 매출액 기준완화 심의 건의('25. 5.)



1. 광역교통 및 지역간 이동편의 도로망 구축 11개 사업 / 총연장 74.79km / 총사업비 46,124억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
고속도로	수도권제2순환고속도로 (2008.~2027.)	L=25.45km, B=23.4m	30,434	【파주~양주】`24.12. 개통완료 【김포~파주】`27.12. 준공목표 보상 100%, 공사 51.9%
	문산~도라산 고속도로 (2018.~2026.)	L=10.75km, B=23.4m	5,685	도로구역 결정 협의 중
국지도	조리~금릉(국지도56) (2022.~2027.)	L=0.92km, B=17.5m (평면확장)	188	`22. 6. 실시설계 착수(서울청) `25. 2. 실시설계 완료 `25. 총사업비협의를및인수인계(서울청→도)
	용미~신산(국지도78) (2006.~2027.)	L=2.94km, B=18.5m	410	`23. 4. 실시설계 착수(서울청) `25. 10. 실시설계 완료 `26. 총사업비협의를및인수인계(서울청→도)
	문산~법원(국지도78) (2018.~2027.)	L=3.28km, B=18.5m	407	`23. 4. 실시설계 착수(서울청) `25. 7. 실시설계 완료 `26. 총사업비협의를및인수인계(서울청→도)
	조리~광탄(국지도98) (2023.~2028.)	L=3.5km, B=20m	530	`24. 5. 실시설계 착수(서울청) `25. 12. 실시설계 완료 `26. 총사업비협의를및인수인계(서울청→도)

1. 광역교통 및 지역간 이동편의 도로망 구축 11개 사업 / 총연장 74.79km / 총사업비 46,124억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
지방도	갈현~축현(지방도359) (2018.~2028.)	L=5.1km, B=20m	843	ˆ 24. 12. 보상협의회 개최 ˆ 25. 4. 보상협의(70%이상확보시착공)
	축현~내포(지방도359) (2022.~2027.)	L=2.66km, B=20m	319	ˆ 23. 7. 실시설계 착수(경기도) ˆ 25. 9. 실시설계 완료 ˆ 26. 보상협의
	월릉~광탄(지방도360) (2004.~2030.)	L=4.6km, B=10.5m	1,065	ˆ 25. 2. 보상협의회 개최 ˆ 25. 6. 보상협의(70%이상확보시착공)
LH	시도1호선 확장 및 신설 (2013.~2029.)	L=8.17km, B=21~25m	1,392	【남측】 공사 73% ˆ 25. 12. 공사 준공 【북측】 공사 47% ˆ 29. 12. 공사 준공 ˆ 27.12까지 부분개통
	김포~관산(지방도358) (2009.~2026.)	L=7.42km, B=20~28m (1.54km) ^{파주구간}	4,851 (2,315) ^{파주구간}	【파주구간】보상 98%, 공사 25% ˆ 22. 8. 공사 착공 ˆ 26. 8. 공사 준공

2. 지역간 교통격차 해소를 위한 간선도로 개설 9개 사업 / 총연장 15.39km / 총사업비 2,609.4억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
상습정체	국지도78호선(선유구간) 상습정체구간 개선사업 (2018.~2026.)	L=0.48km, B=25m	274	※ 지장물보상 장기화 `23. 3. 공사 착공 `26. 12. 도로 개통
주한미군	캠프하우즈 진입도로 개설 (2018.~2027.)	L=1.42km B=10~20m	285	`23. 12. 공사 착공 `27. 4. 공사 준공
특수상황	야당~상지석 동측 연결도로 개설 (2019.~2025.)	L=1.20km, B=12m	279	`23. 7. 공사(1차분) 착공 `25. 12. 공사 준공
	법원읍 초리골 도로확포장 (2022.~2026.)	L=0.89km, B=10m	72	`24. 12. 보상 착수 `25. 9. 보상 완료 `26. 12. 공사 준공
	감악산 자연휴양림 진입도로 개설 (2023.~2026.)	L=1.50km, B=10m	66	`24. 6. 공사 착공 `24. 9. 보상 착수 `26. 12. 공사 준공
	위전~영태간 도로확포장 (2023.~2027.)	L=1.60km, B=10m	135	`24. 11. 보상 착수 `26. 12. 보상 완료 `27. 12. 공사 준공

2. 지역간 교통격차 해소를 위한 간선도로 개설 9개 사업 / 총연장 15.39km / 총사업비 2,609.4억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
광역교통	야동~금승(지방도363) 도로확포장 (2022.~2031.)	L=5.60km, B=20m	1,298	ˆ25. 12. 설계용역 완료 ˆ26. 보상 착수 ˆ31. 사업 완료
기 타	상지공단 진입도로 확장 (2023.~2025.) ※ 상지공단·퍼스트가든 제안사업	L=0.60km, B=10m	55.5 市 34.5 제안자 21	* 설계 완료 ˆ24. 9. 도시관리계획 결정(변경) ˆ24. 12. 보상 착수 ˆ25. 5. 공사 착공 ˆ25. 12. 공사 준공
	문발산단~송촌IC 도로확포장(시도41호선) (2025.~2028.)	L=2.1km, B=20m (2→4차로)	144.9	ˆ25. 6. 설계용역 착수 ˆ26. 10. 토지보상 협의 ˆ27. 3. 공사 착공 ˆ28. 12. 공사 준공

3. 편안하고 안전한 보행친화도시 파주 조성 7개 사업 / 총연장 17.39km / 총사업비 751.8억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
기 타	장기미집행 도시계획도로 (2019.~2026.)	L=13.03km, 44개소 (보상 35 개설 9)	653	* (보상) 19개소 완료 * (공사) 5개소 개설 완료 `25. 6. 수용재결 완료 `25. 12. 3개소 공사 준공 `26. 12. 1개소 공사 준공
	법원읍대능리 도시계획도로 (2024.~2025.)	L=0.55km, B=8m	14.5	`24. 12. 공사 착공 ^{1구간(6억원)} `25. 12. 공사 준공 ^{1구간}
	당동리 마을도로 개선 (2024.~2025.)	L=0.22km, B=7m	6	`25. 1. 설계 완료 `25. 5. 공사 착공 `25. 7. 공사 준공

3. 편안하고 안전한 보행친화도시 파주 조성 7개 사업 / 총연장 17.39km / 총사업비 751.8억원

구분	사업명(사업기간)	사업량	총사업비(억원)	추진계획
신 설	운정신도시~야당동간 보도육교 설치 (2023.~2025.)	보도육교 L=0.99km, B=4.5m	53	^ 24. 6. 공사 착공 ^ 25. 9. 공사 준공
	보도설치 (2025.)-자체	L=0.68km, 4개소	5.2	* 자체 4개소 ^ 25. 1. 설계용역 착수 ^ 25. 3. 공사 착공 ^ 25. 6. 공사 준공
	보도설치 (2025.)-주민참여	L=1.92km, 8개소	17.5	* 주민참여 8개소 ^ 25. 1. 설계용역 착수 ^ 25. 3. 공사 착공 ^ 25. 6. 공사 준공
정 비	보행자우선도로 조성 (2025.)-행정안전부 공모	1개소	2.6	^ 25. 5. 특별교부세 교부 ^ 25. 7. 보행자우선도로 지정 고시 ^ 25. 9. 보행자우선도로 조성계획 고시 및 공사 착공 ^ 25. 11. 공사 준공

1. 올바른 주차문화 정착

- 주차공간 확충을 통한 안전하고 편리한 도시환경 조성
 - 민간 건축물 부설주차장 개방을 통한 도심지 내 주차공간 확보
 - 주거밀집지역 내 거주자우선주차장 조성을 통한 주거지 생활 환경 개선

사업명	위 치	규 모	추진사항 및 향후계획
부설주차장 개방 지원	파주시 전역	협의에 따름 (최소 5면 이상)	<ul style="list-style-type: none"> • '24. 10. 계획수립 및 방침결재 • '24. 12. 지방보조금 관리위원회 심의 • '25. 01. 개방 가능 시설 확인 · 조사 • '25. 06. 개방 건축물 수요 조사(예산편성) • '25. 09. 예산 확보 및 추진
거주자우선주차장 조성	와동동 1613, 1627 (지산고 앞)	노상주차장 주차 28면	<ul style="list-style-type: none"> • '24. 08. 파주소방서 사전협의 • '24. 11. 교통안전시설 심의 승인(경찰서) • '25. 04. 거주자우선주차장 조성 • '25. 05. 이용자 모집 • '25. 06. 운영 개시

● 주차공간 확충 및 운영관리를 통한 안전하고 스마트한 주차환경 조성

▪ 무료 공영주차장 재정비 및 유료화 운영

사업명	사업비	사업규모	추진사항 및 향후계획
운정1 공영주차장 조성사업	123,400천원	지평식 주차장 , 주차 216면	· '25. 03. 실시설계 완료 · '25. 04. 공사착공 · '25. 05. 공사준공
운정3 공영주차장 조성사업	299,890천원	지평식 주차장, 주차 146면	· '25. 03. 실시설계 완료 · '25. 04. 공사착공 · '25. 06. 공사준공



운정1 공영주차장(준공 완료)



운정3 공영주차장(공사 진행중)

● 주차공간 확충 및 운영관리를 통한 안전하고 스마트한 주차환경 조성

- 무료 공영주차장 재정비 및 유료화 운영

사업명	사업비	사업규모	추진사항 및 향후계획
파주센트럴밸리 공영주차장 조성사업	171,480천원	지평식 주차장, 주차 93면	· '25. 03. 실시설계 완료 · '25. 04. 공사착공 · '25. 06. 공사준공
파주역 공영주차장 유료화 사업	(기 조성)	지평식 주차장, 주차 77면	· '22. 09. 공사준공



파주센트럴밸리 (공사 진행중)




파주역 공영주차장(기 조성)

● 주차공간 확충 및 운영관리를 통한 안전하고 스마트한 주차환경 조성

- 무료 공영주차장 재정비 및 유료화 운영

사업명	사업비	사업규모	추진사항 및 향후계획
CCTV 및 주차관제 시스템 설치 (운정1, 운정3, 파주역, 파주센트럴밸리)	454,000천원	주차관제 시스템 4식/ CCTV 4식	· '25. 04. 공사착공 · '25. 06. 공사준공

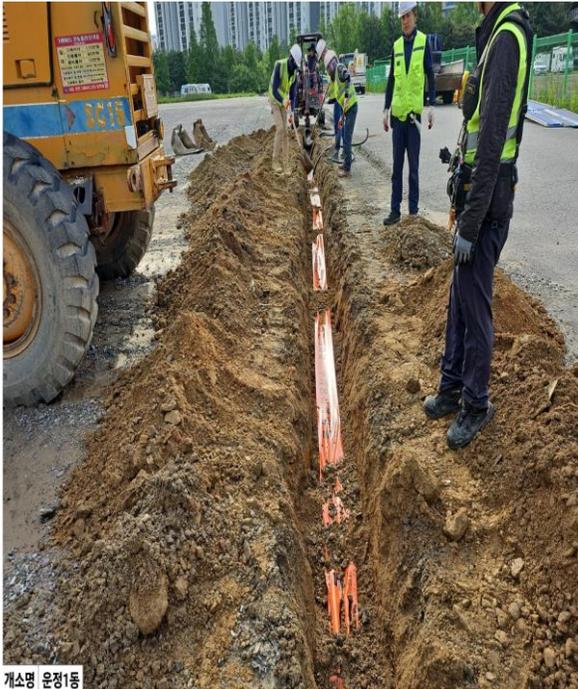

개소명 운정1동

운정1



운정3



위치 파주역공영주차장

파주역




위치 파주센트럴밸리공영주차장

파주센트럴밸리

● 주차공간 확충 및 운영관리를 통한 안전하고 스마트한 주차환경 조성

▪ 공영주차장 주차환경개선 공사

사업명	사업비	사업규모	추진사항 및 향후계획
금촌2 공영주차장 보수공사	1,871,000천원	철골식 주차장, 주차 308면 유지보수공사	<ul style="list-style-type: none"> · '25. 03. 보수 건축설계용역 착수 · '25. 05. 구조정밀안전진단 실시 · '25. 06. 보수 건축설계용역 준공 · '25. 07. 주차장 폐쇄 및 공사 착수 · '25. 11. 공사 준공 및 주차장 개방

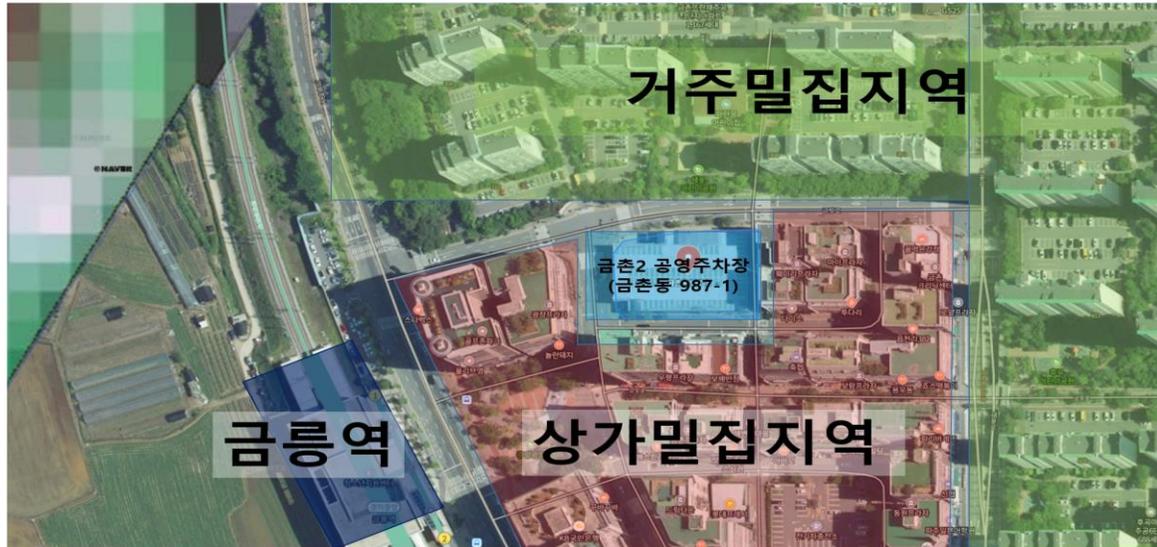

위치도



현장사진

● 불법주정차 없는 안전한 거리 조성

■ 시민들이 공감할 수 있는 합리적인 주차단속업무 추진

- 도로 및 교통 여건에 따른 맞춤형 주차단속
→ 평일 09:00 ~ 21:00, 주말 09:00 ~ 18:00
※ 점심단속유예 11:30 ~ 14:00

■ 주정차 특별단속 시행

- 주정차 (5분) 단속구간 (평화로, 산내마을 상가, 가람로, 해울1~2길, 운정고교)
- 단속시간 연장 구간 (야당환승주차장 주변 황색복선구간, 금촌로터리, 운정고교 등)

■ 불법 주정차 단속 장비 설치 · 운영

- 상습 정체구간 및 상가 밀집지역 신규 CCTV(5개소) 설치 예정

1. 첨단 지능형교통체계(ITS) 구축

● 첨단 지능형교통시스템(ITS) 운영 및 유지관리

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- 사업비: 2,592백만원
- 사업내용
 - 교통 데이터 기반 실시간 정보제공 (전광판, 홈페이지 등) 및 분석자료 관련 부서(기관) 송부
 - 스마트 횡단보도, 우회전 안전시스템, 돌발상황, 긴급차량 우선신호 운영
 - 버스정보안내기, 통합주차정보시스템 유지관리 및 기능개선

● 주요 교차로 신호체계 개선

- 추진방안: 스마트교차로 교통량 분석 기반 신호 최적화
- 추진실적
 - 신호 주기 조정: 운정지구 주요교차로 출퇴근 제외, 교통량이 적은 시간대 및 휴일 기준 210초 → 180초 조정
 - 신호 연동 개선: 운정 3지구 및 원인자 공사 신규 교차로 신호 연동값 조정

2. 최첨단 도시 조성을 위한 기반 마련

● 주요 정보통신 기반시설 정보보호 추진

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- 사업비: 168백만원
- 사업내용: 기반시설 정보시스템에 대한 취약점 분석·평가 관리, 위험도 평가, 모의해킹 등

● 도시정보시스템 통합 유지관리

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12. 장기계속사업
- 사업비: 2,330백만원(1차년도 1,132백만원, 2차년도 1,198백만원)
- 사업내용: 도시정보센터 정보시스템 및 현장 시설물 장비 유지관리

● 도시정보센터 출입 관리시스템 교체 사업

- 사업기간: 2025. 2. ~ 6.
- 사업비: 160백만원
- 사업내용: 출입관리 키오스크 설치, 컨트롤러 및 개폐장치 교체

3. 시민이 안전한 파주시 조성


● 시민 안전을 위한 생활환경 구축

▪ 신규 방법용 CCTV 60개소 250대 설치(1,561백만원)

사 업 명	예산액(백만원)	설치 개소 및 수량
방법 CCTV 설치(도심/비도심)	1,307	50개소 202대
방법 CCTV 설치(주민참여예산)	54	2개소 8대
방법 CCTV 설치(특교세 / 운정, 교하)	200	8개소 40대

▪ CCTV 통합관제센터 운영 실적(2025년 5월말 기준)

주요 예방 관제	수사 영상 제공	대민 영상 처리	비상벨 대응	민원 접수 처리
116건	848건	191건	1,361건	155건

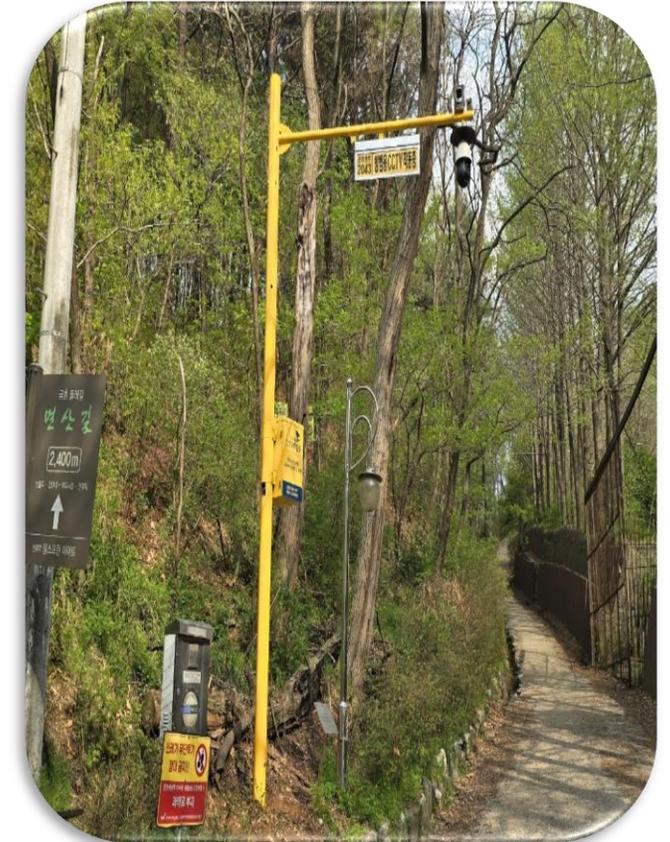

방법 CCTV 설치 전경

1. 시민 만족 차량 민원 서비스 제공

● 차량등록 및 민원처리 현황

(2025.3.31. 기준 / 단위 : 대,건)

구분	계	자동차	건설기계	이륜자동차
등록 현황	291,573	267,268	5,777	18,452
민원처리 현황	189,587	170,227	6,483	12,877

● 건설기계 임시 공영 주기장 추가 조성

- 대지위치: 월롱면 영태리 645 일대(토지소유자 국방부)
- 이용대상: 건설기계, 화물차 등 대형차량 소유자
- 주기면수: 165면(기존 100면 → 65면 추가 조성)
- 이 용 료 : 무료(파주시 직영 관리)
- 사 업 비 : 251,000천원
- 이용현황: 2025. 3월 운영개시 / 144면 등록 완료

2. 자동차 법규위반 행위자 사법 처리로 법질서 확립

무보험 무단방치 사건처리 (사법처리)

계	검찰송치	이첩	범칙금 납부	내사 종결
155건	74건	49건	17건	15건

무단방치 민원 (행정처리)

계(신고접수)	자진처리	강제폐차	공고	운행정지
78건	11건	13건	32건	22건

3. 안전관리 강화를 위한 과태료 및 취득세 부과 추진

● 자동차 과태료 및 취득세 부과 · 징수 현황

(2025.3.31. 기준 / 단위 : 건,천원)

구분	부과		징수		징수율(%)	비고
	건수	금액	건수	금액		
과태료	4,999	778,755	3,335	243,429	31.26%	전년 동기대비 징수율 2.01% 상승
취득세	9,359	12,814,217	9,345	12,807,420	99.94%	

● 과태료 및 체납액 발생 최소화

- 안내 서비스 강화로 보험 · 검사 이행 촉구
- 보험 · 검사 의무사항 관련 홍보물 제작 및 배부
- 거소지 정비 등 사후관리 철저
- 이의신청 제도 적극 안내

● 체납징수 활동 강화

- 신속한 채권확보를 위한 수시 재산 조회 및 압류
- 30만원 이상 체납자 표적 영치 실시
- 100만원 이상 체납법인 사업장 조사
- 생계형 체납자 분납 유도

감사합니다.
